



תאריך: 31-07-16		82035		דוח מס'	
עמוד 1 מתוך 3		בדיקת צנרת דלק בתחנה			
ארז מילוא	איש הקשר:	אוניברסיטת חיפה			שם הלקוח:
ארז מילוא	איש הקשר:	אוניברסיטת חיפה	כתובת האתר/תחנה:	מיכלי סולר בניין ראשי	שם האתר/תחנה:

הבדיקה לפי תקן/מפרט:		עדכון:	
סוג המשאבה:		<input type="checkbox"/> פריקה	<input checked="" type="checkbox"/> יניקה
סוג החומר המכסה את הקווים:		<input type="checkbox"/> אספלט	<input type="checkbox"/> אדמה
עומק הקווים:		1.5	<input type="checkbox"/> אחר
מזג אוויר:		<input checked="" type="checkbox"/> בהיר	<input type="checkbox"/> אביך
תחנות תדלוק:		<input type="checkbox"/> גשום	<input type="checkbox"/> מעונן
אפיון הקו:		1	<input type="checkbox"/> שרבי
הנוזל:		סולר	<input type="checkbox"/> פלסטיק
מס' קו:		1	מחובר למיכל:
נקודת חיבור:		מהמיכל	סולר T-1

הערות	שינוי נטו	נפח cc		לחץ PSI		זמן
		אחרי בדיקה	לפני בדיקה	אחרי קיזוז	לפני קיזוז	
Bleed Back	75	380	305	0	12.5	09:34
תחילת בדיקה		305		12.5		09:35
	0	305	305	12.5	12.5	09:50
	0	305	305	12.5	12.5	10:05
	0	305	305	12.5	12.5	10:20
	0	305	305	12.5	12.5	10:35
Bleed Back	75	380	305	0	12.5	10:36

סיכום תוצאות		
הערות	עומד בדרישות *	שינוי נטו לשעה
	כן	0

* מתייחס לדרישות המשרד לאיכות הסביבה ו-EPA.



תאריך: 31-07-16		בדיקת צנרת דלק בתחנה		82035	דוח מס'
עמוד 2 מתוך 3					
ארז מילוא	איש הקשר:	אוניברסיטת חיפה			שם הלקוח:
ארז מילוא	איש הקשר:	אוניברסיטת חיפה	כתובת האתר/תחנה:	מיכלי סולר בניין ראשי	שם האתר/תחנה:

הבדיקה לפי תקן/מפרט:				עדכון:			
סוג המשאבה:				<input type="checkbox"/> פריקה	<input checked="" type="checkbox"/> יניקה	<input type="checkbox"/> סניקה	<input type="checkbox"/> אחר
סוג החומר המכסה את הקווים:				<input checked="" type="checkbox"/> בטון	<input type="checkbox"/> אספלט	<input type="checkbox"/> אדמה	<input type="checkbox"/> אחר
עומק הקווים:				1.5	סוג החומר:	<input type="checkbox"/> פיבר	<input checked="" type="checkbox"/> פלדה
מזג אוויר:				<input checked="" type="checkbox"/> בהיר	<input type="checkbox"/> גשום	<input type="checkbox"/> מעונן	<input type="checkbox"/> שרבי
תחנות תדלוק:							
אפיון הקו:	הנוזל:	סולר	מס' קו:	2	נקודת חיבור:	מהמיכל	מחובר למיכל:
							סולר T-1

הערות	שינוי נטו	נפח cc		לחץ PSI		זמן
		אחרי בדיקה	לפני בדיקה	אחרי קיזוז	לפני קיזוז	
Bleed Back	100	380	280	0	12.5	10:44
תחילת בדיקה		280		12.5		10:45
	0	280	280	12.5	12.5	11:00
	0	280	280	12.5	12.5	11:15
	0	280	280	12.5	12.5	11:30
	0	280	280	12.5	12.5	11:45
Bleed Back	100	380	280	0	12.5	11:46

סיכום תוצאות		
הערות	עומד בדרישות *	שינוי נטו לשעה
	ק	0


* מתייחס לדרישות המשרד לאיכות הסביבה ו-EPA.



תאריך: 31-07-16 עמוד 3 מתוך 3	בדיקת צנרת דלק בתחנה		82035	דוח מס'
ארז מילוא	איש הקשר:	אוניברסיטת חיפה		שם הלקוח:
ארז מילוא	איש הקשר:	אוניברסיטת חיפה	כתובת האתר/תחנה:	שם האתר/תחנה:
			מיכלי סולר בניין ראשי	

סקיצת הצנרת באוניברסיטת חיפה

מיכלי סולר בניין ראשי

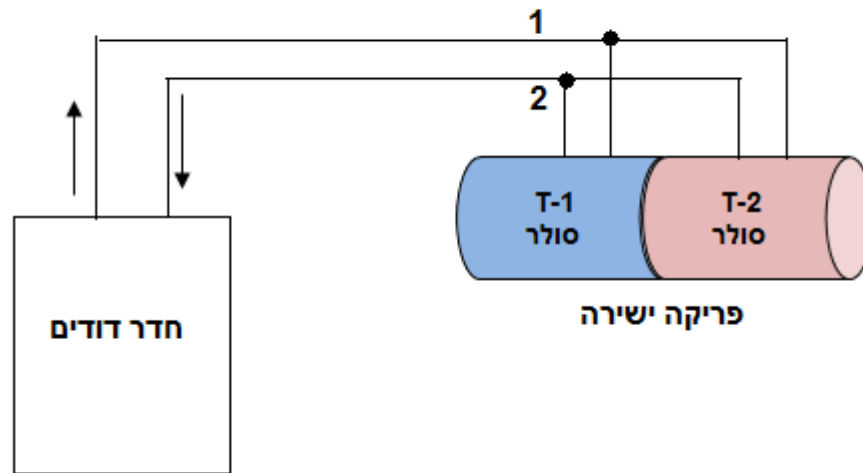

← סולר הדלוח →

חתימה:

מ. בקאל

שם הבודק:
